



Projet de construction d'un tramway à Québec - Complément de réponses à la question #28 du BAPE portant sur l'échéancier

356

DQ14.2.3

Projet de construction d'un tramway à Québec

6211-14-012

- Mise à jour de l'échéancier sommaire
- Mise à jour de la planification des grandes étapes
- Mise à jour des dates des grands jalons
- Mise en service



- Validation des besoins
- Définition des tracés
- Définition des modes
- Insertion de référence
- Estimé budgétaire


- Insertion optimisée
- Plans d'aménagement
- Révision des coûts
- Processus d'approvisionnement
- Acquisitions optimisées
- Conception des systèmes
- Évaluation environnementale

- Conception définitive
- Travaux préparatoires
- Travaux de construction
- Intégration du matériel roulant et des systèmes
- Période d'essai et de mise en service



Échéancier Tramway

Phase de Planification du projet RSTC – les grands jalons

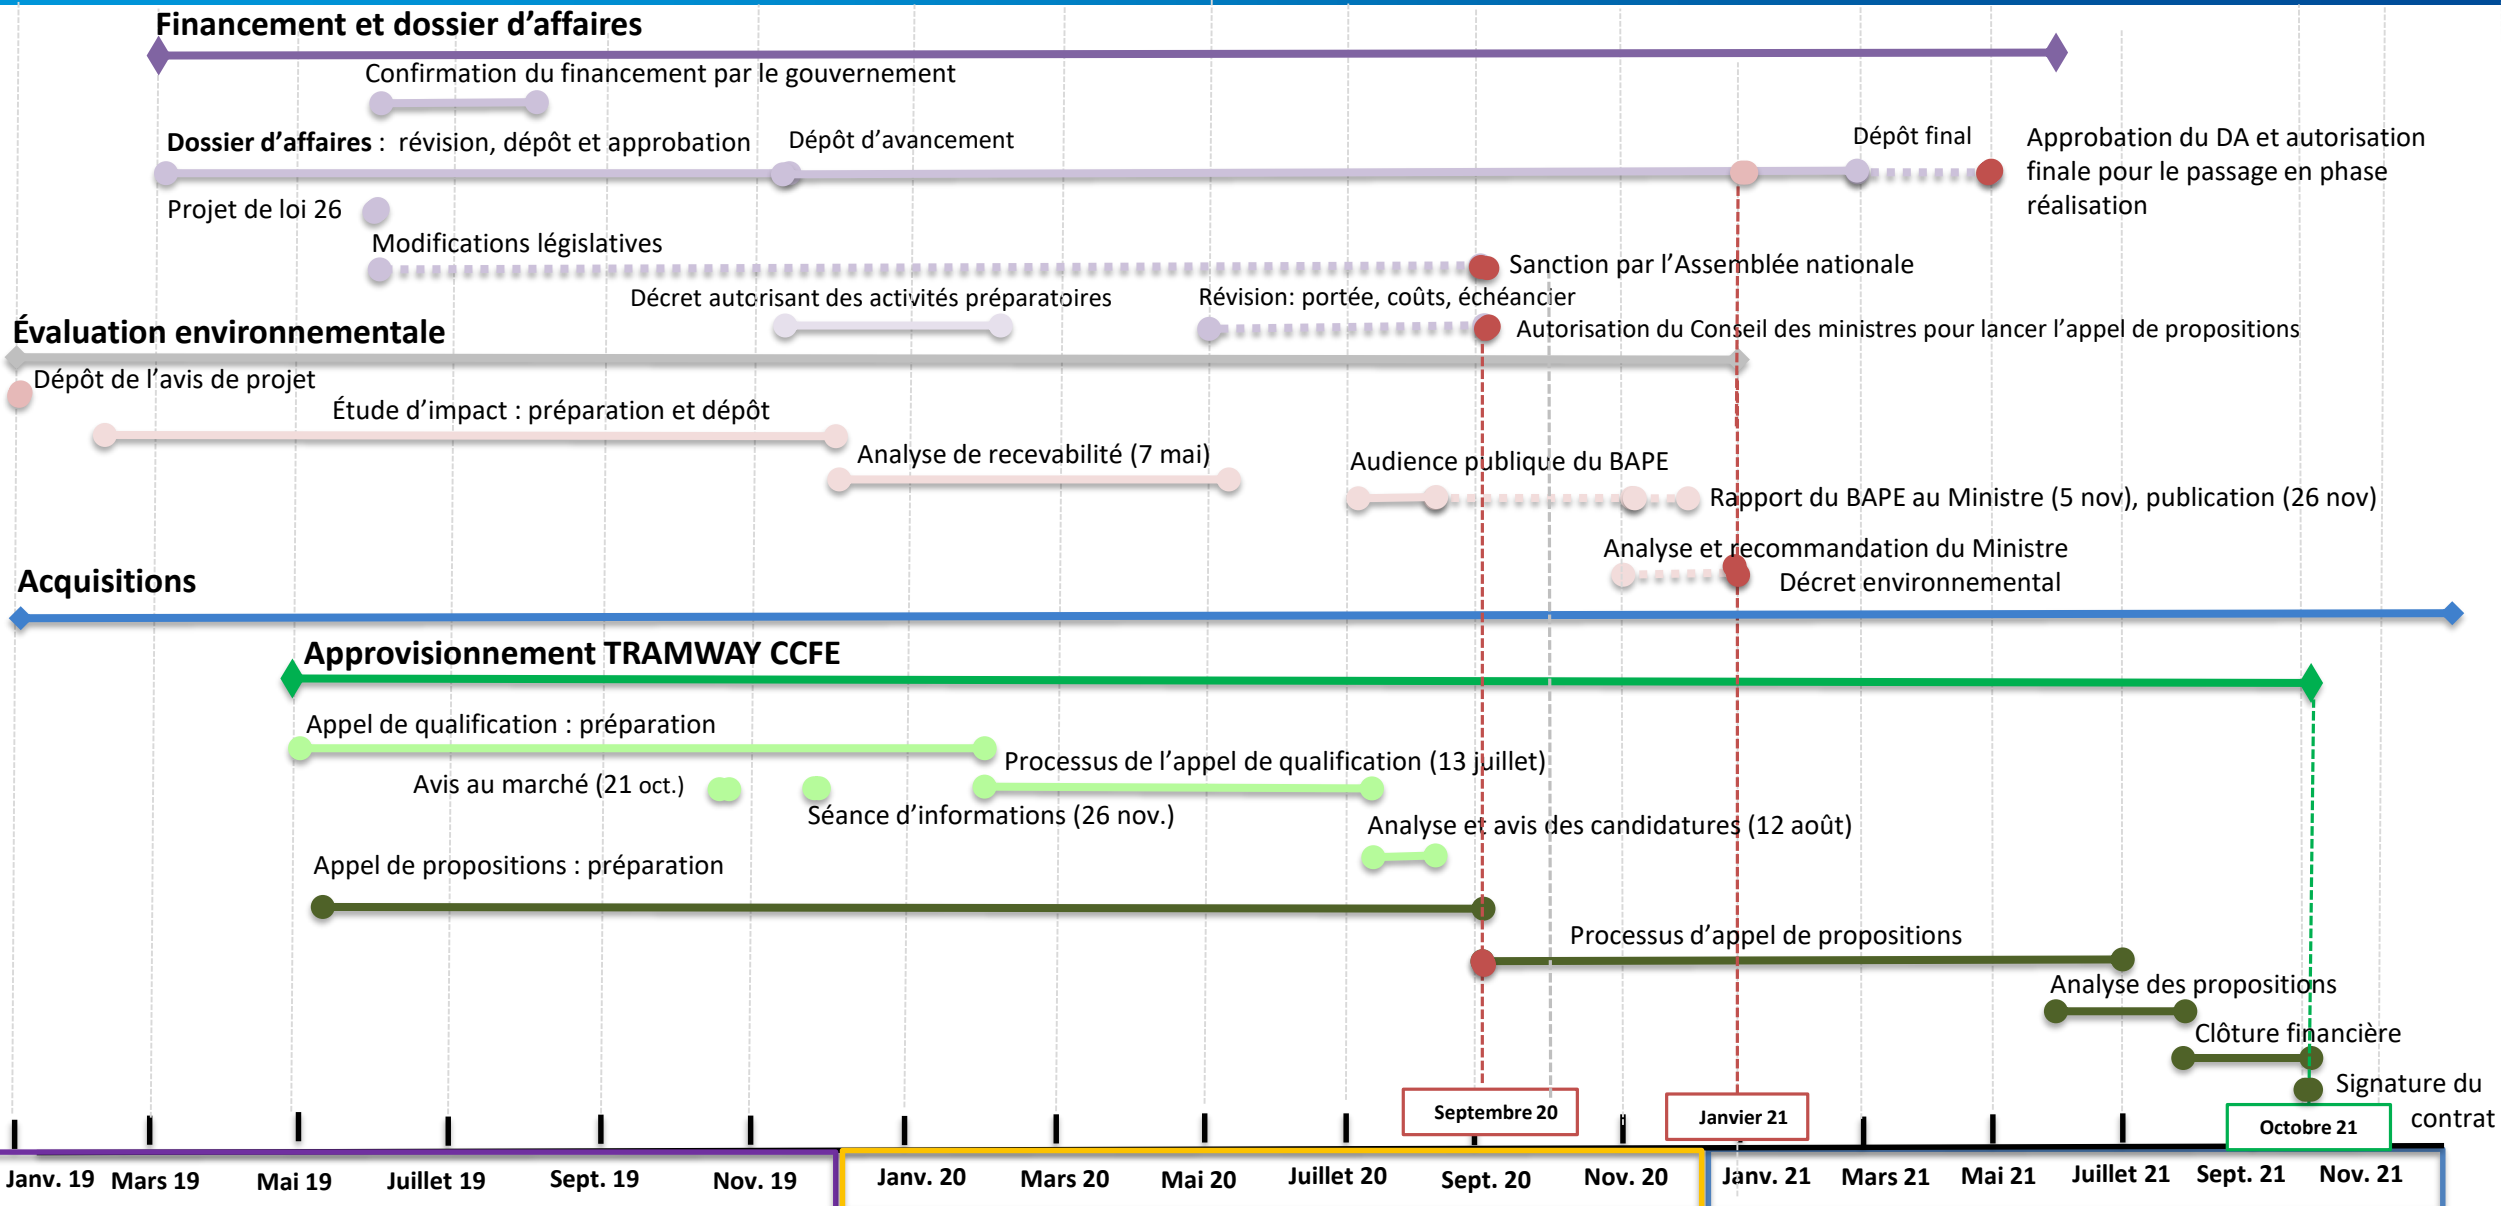

● ● Délais indépendant du bureau de projet



Dates des jalons selon les grands dossiers du projet tramway


Grandes activités	Échéancier sommaire – grands jalons	Référence SDP	Date de fin prévue	Statut *
Financement et dossier d'affaires	Dépôt du dossier d'affaires final	2.1.1	Mars 2021	En cours
	Approbation du dossier d'affaires et le décret gouvernemental pour le passage à la phase réalisation	2.1.1	Printemps 2021	En cours
	Modifications législatives (amendement)	2.1.1	Sept. 2020	En cours
	Projet de loi 26 adopté par l'Assemblée nationale	2.1.1	14 juin 2019	Terminé
	Confirmation du financement du gouvernement du Canada	2.1.1	19 août 2019	Terminé
Évaluation environnementale	Dépôt de l'étude d'impact environnementale (EIE)	2.1.2	Déc. 2019	Terminé
	Analyse de la recevabilité	2.1.2	Mai. 2020	Terminé
	Décret gouvernemental définitif à la suite de la tenue du BAPE	2.1.2	Janv. 2021	En cours
Acquisitions	Préparation des plans préliminaires d'acquisitions	2.2.1	Févr. 2020	Terminé
	Acquisition gré à gré ou par expropriation - libération de l'emprise	2.2.1	Déc. 2021	En cours
Conception préliminaire	Conception préliminaire rédaction et exigences du devis techniques composants les termes de références techniques de l'Appel de propositions	2.2.2	Sept. 2020	En cours
	Plan préliminaire des réseaux techniques urbains	2.2.2	Avril 2020	Terminé
	Mandat (no.1) SYSTRA	2.2.2	Sept. 2020	En cours
	Mandats (no.1 et no.2) Tram-Innov	2.2.2	Sept. 2020	En cours
Approvisionnement tramway	Avis public au marché	2.2.3	Oct. 2019	Terminé
	Séance d'information	2.2.3	Nov. 2019	Terminé
	Appel de qualification	2.2.3	Fév. 2020	Terminé
	Sélection des firmes qualifiées	2.2.3	Août 2020	En cours
	Appel de propositions	2.2.3	Sept. 2020	En cours
	Sélection du consortium privilégié	2.2.3	Août 2021	À venir
	Signature du contrat	2.2.3	Oct. 2021	À venir
Travaux préparatoires	Travaux préparatoires préalables à la construction du tramway (déplacement des réseaux techniques urbains, décontamination, vannes d'aqueduc, etc.)	3.1.3	Déc. 2024	En cours
Protocoles d'ententes	Divers protocoles d'ententes	2.2.3	Janv. 2022	En cours
Mise en service	Mise en service du tramway (Phase 1)	3.1.6	Déc. 2026	À venir
	Mise en service du tramway (Phase 2)	3.1.6	Déc. 2027	À venir



Phase réalisation Mise en service de la composante tramway en mode CCFE

Mise en service du tramway en deux phases: longueur importante de la ligne (22 km) et ordonnancement des travaux:

- Du Terminus Le Gendre au pôle d'échanges de l'Université Laval:
 - Démarrage en 2022
 - Centre d'entretien et d'exploitation: rôle clé pour le système
 - Mise en service à l'automne 2026
- Du pôle d'échanges de l'Université Laval au Terminus Charlesbourg:
 - Démarrage en 2022 du tunnel Colline parlementaire
 - Démarrage en 2023 du reste des tronçons
 - Mise en service à l'automne 2027

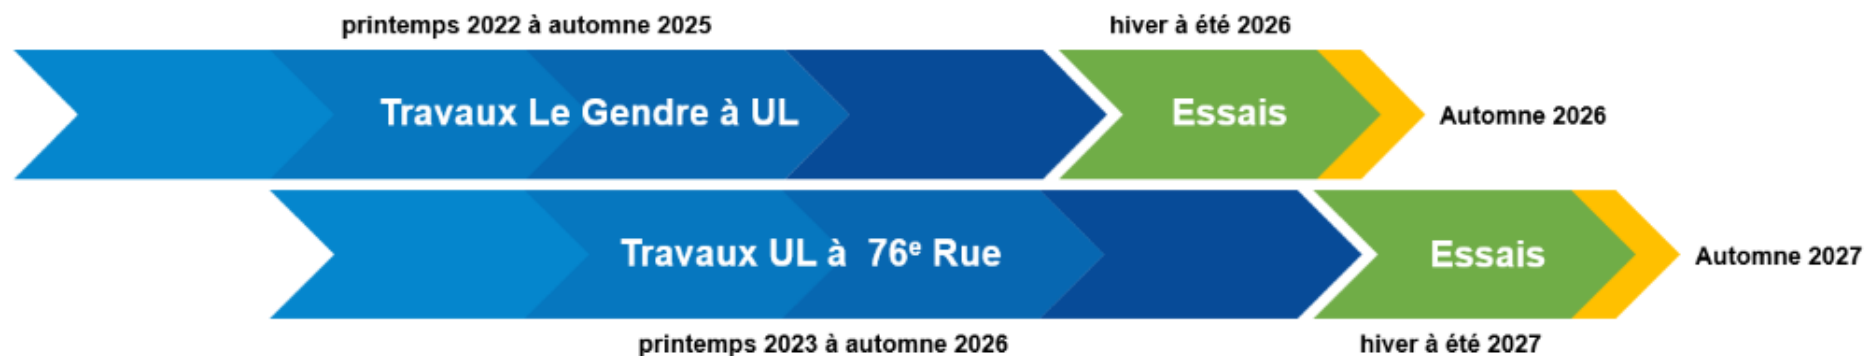



Phase réalisation

Réalisation des voies réservées à haut niveau de service et autres parcours

-  Tramway
Réseau de 22 km
-  Voies réservées
Est-Ouest
Réseau de 12,6 km
-  Voies réservées
Nord et Est
Réseau de 22,3 km

Voies réservées:

Échéancier parallèle à une portion de l'échéancier du tramway

Déploiement successif de 2024 à 2027

