Échéancier Angliers

Nº	Nom de la tâche	Durée
1	**Construction**	**515 jours**
2	Fabrication des équipements électromécaniques	390 jours
3	Déboisement et préparation terrain	10 jours
4	**Préparation du terrain**	**123 jours**
5	Mobilisation	15 jours
6	Batardeau amont	20 jours
7	Route 391 de détournement	5 jours
8	Batardeau aval	15 jours
9	**Excavation**	**163 jours**
10	Digue	10 jours
11	Canal d'amenée	30 jours
12	Évacuateur auxiliaire	10 jours
13	Centrale	88 jours
14	Canal de fuite et canal évacuateur	70 jours
15	Injection et ancrage	115 jours
16	Pont	143 jours
17	**Centrale**	**283 jours**
18	Travaux civil	283 jours
19	Mécanique et électricité de puissance	90 jours
20	Mécanique et électricité auxiliaires	45 jours
21	Démantèlement batardeau amont	15 jours
22	Mise en service de la centrale	20 jours

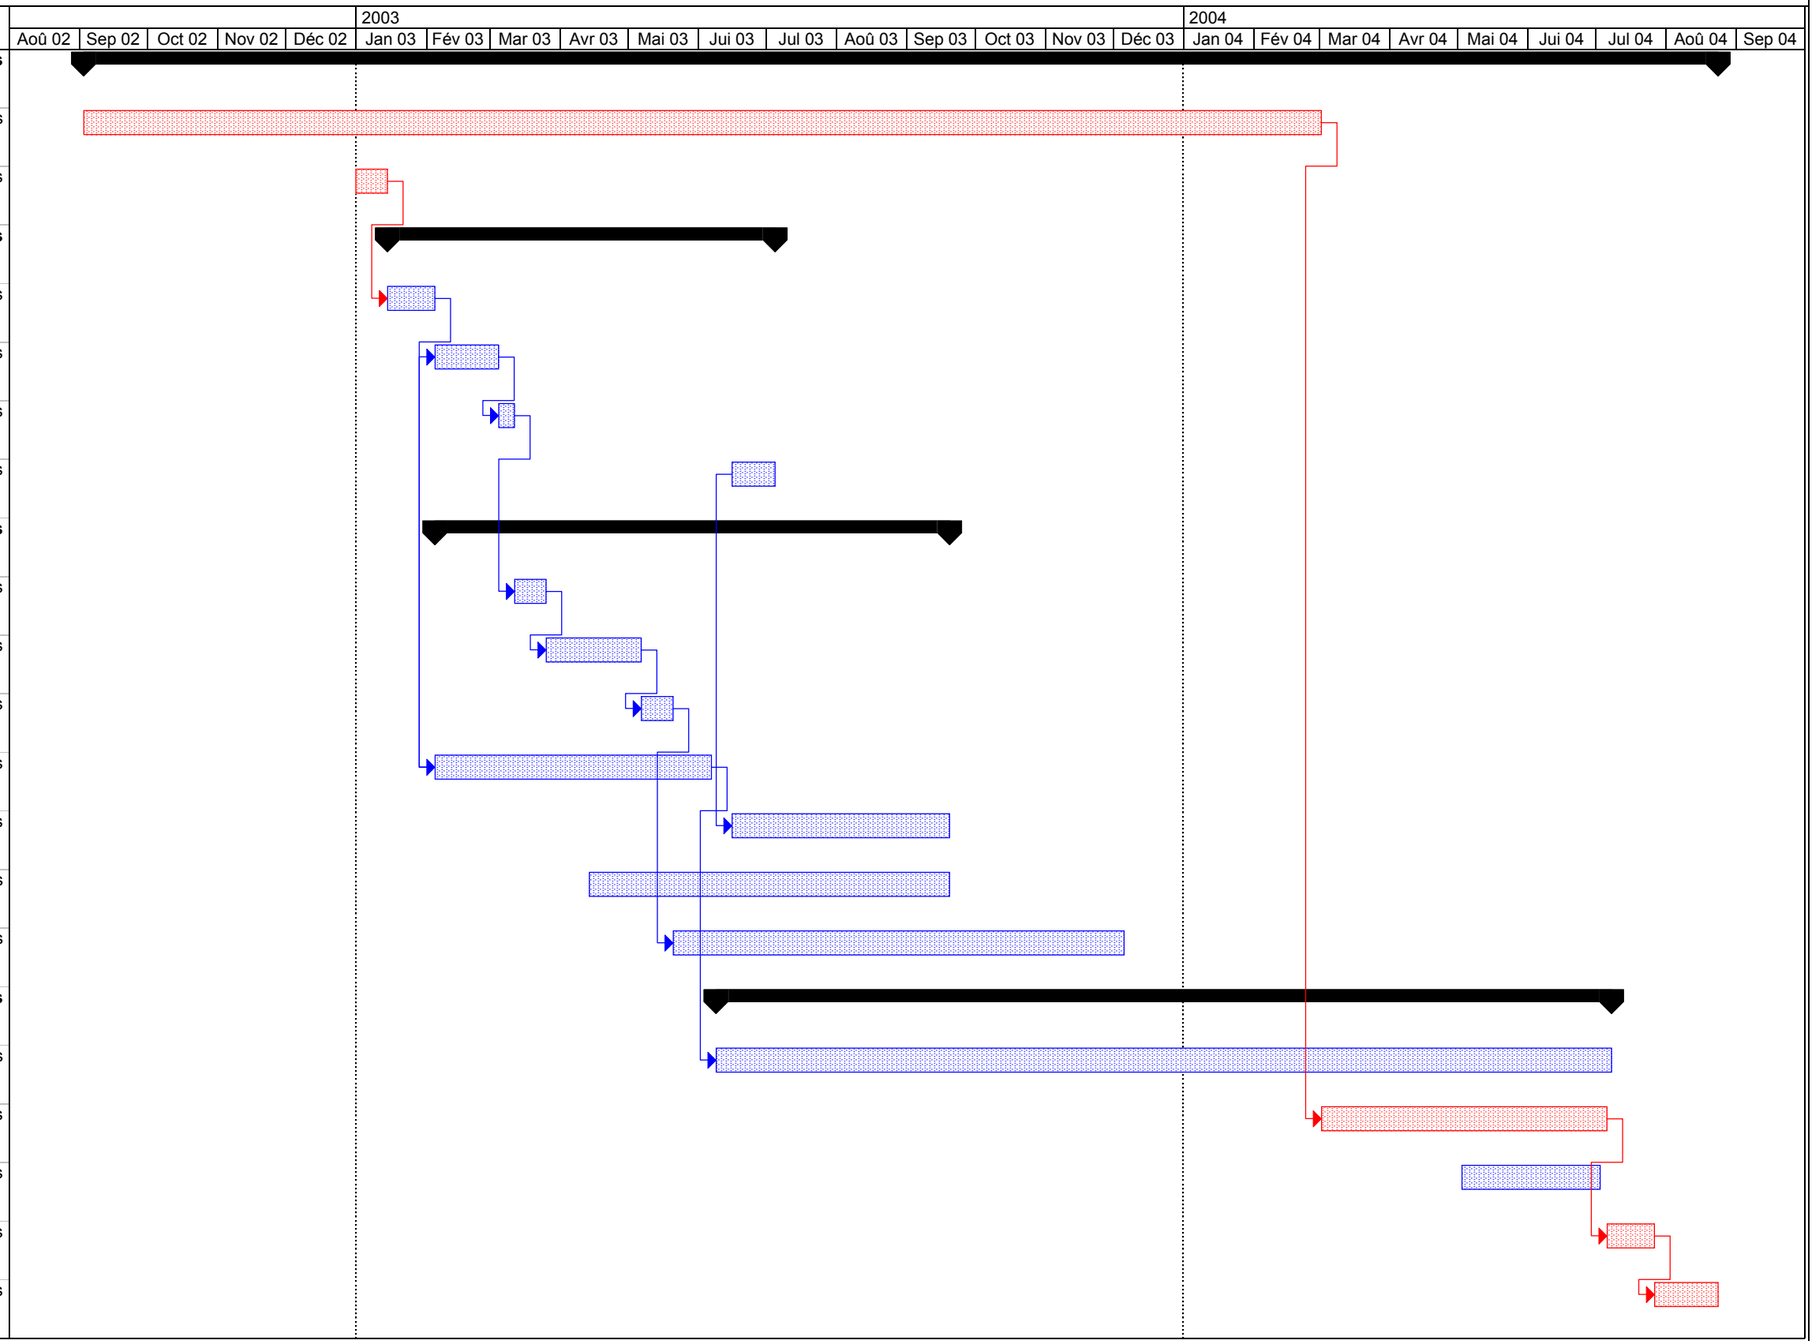

Projet: Angliers
No. M96531

Tâche | Tâche critique | Récapitulative | Jalons externes | Échéance
